

## PLANO DO PROJETO 0404070

### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

<b>Título do projeto:</b>	Fortalecimento da Gestão – Atualização do PDI
<b>Demandante:</b>	PRODIN
<b>Líder do projeto:</b>	Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos
<b>Áreas envolvidas</b>	PRODIN, Reitoria e Campi
<b>Período de execução:</b>	2019-2
<b>Valor previsto:</b>	R\$ 22.369,19

### 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto visa implantar um fluxo de atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 que servirá de parâmetro para as próximas atualizações previstas para o período.

### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto contribui diretamente com os seguintes objetivos estratégicos:

- Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;
- Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários;
- Ampliar e Consolidar a infra-estrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

### 4. PÚBLICO DO PROJETO

Beneficiados diretamente: Gestores do IFRO;

Beneficiados indiretamente: Servidores, alunos, parceiros do IFRO e sociedade como um todo.

## 5.EFEITOS DO PROJETO

O fortalecimento das pesquisas de apoio à gestão proporcionará ao IFRO:

- Atualização do PDI 2018-2022 com a legislação que incide sobre as atividades do IFRO;
- Atualização da Análise Pestal e Matriz SWOT do IFRO;
- Realização de 9 ou 10 fóruns de gestão com a finalidade de dialogar com a comunidade interna e externas sugestões para novos projetos estratégicos, e ;
- Revisão do Plano de Oferta de Cursos e do Plano de Obras;


## 6.PRODUTO FINAL

PDI 2018-2022 atualizado e fluxo de atualização do PDI definido.

# ESCOPO DO PROJETO

## 1.ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto - EAP é uma ferramenta de comunicação que expõe, de forma sintética e direta, as principais entregas do projeto.

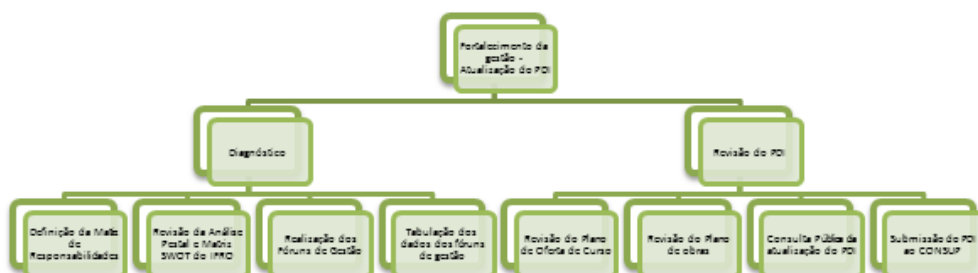

## 2.ESCOPO DO PRODUTO

**2.1.ETAPA 1 - Diagnóstico:** A atualização do PDI depende do levantamento de dados para identificar quais são as leis novas que incidem sobre as atividades do IFRO e quais partes do texto do PDI precisarão ser adequados Além disso é necessário dialogar com a comunidade interna e externa sobre sugestões de novos projetos estratégicos. Essa etapa é composta pelas seguintes entregas:

**2.1.1 Matriz de Responsabilidade da atualização do PDI:** É o documento que contém a definição de quem são os responsáveis pela revisão de cada parte do texto;

2.1.2 *Revisão da Análise Pestal e Matriz SWOT do IFRO*: Revisão dos documentos que contém a análise de ambiência externa do IFRO, um na matriz PESTAL e outro na Matriz SWOT;

2.1.3 *Realização de 9 ou 10 fóruns de gestão nos municípios com unidades do IFRO*: Realização de eventos para mobilizar a comunidade interna e externa para a discussão de temas relevantes para atualização do PDI bem como da coleta de sugestões para novas ações e projetos institucionais. A realização de 10 eventos está condicionada ao início do funcionamento do Campus Avançado São Miguel do Guaporé, com previsão de início de atividades em 2019;

2.1.4 *Relatório dos Fóruns de gestão sintetizando as contribuições feitas pela comunidade interna e externa*: Entrega de um documento contendo todas as contribuições feitas pela comunidade interna e externa nos fóruns de gestão para subsidiar a tomada de decisão dos dirigentes.

**2.2 ETAPA 2 – Revisão do PDI 2018-2022**: A etapa de revisão do PDI 2018-2022 consiste da revisão do Plano de Oferta de Cursos para adequá-lo as necessidade e capacidade de oferta dos campi em todas as modalidades e níveis. Além disso será necessário também fazer um novo Plano de Obras considerando as necessidades de cada uma das unidades e a capacidade de investimento do IFRO para o período de vigência do PDI. Essa etapa é composta pelas seguintes entregas:

2.2.1 *Revisão do Plano de Oferta de Cursos (capítulo 3 do PDI)*: Entrega da versão atualizada do plano de oferta de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino;

2.2.2 *Revisão do Plano de Obras (capítulo 7 do PDI)*: Entrega da versão atualizada do plano de obras a serem executadas na Reitoria e nos Campi até 2022;

2.2.3 *Realização da Consulta Pública da atualização do PDI no portal do IFRO*: Entrega da versão da Revisão do PDI 2018-2022 após consulta pública no portal do IFRO;

2.2.3 *Aprovação da atualização do PDI 2018-2022 junto ao CONSUP*: Entrega do versão PDI 2018-2022 revisado e aprovado junto ao CONSUP.

## RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

AÇÃO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS				VALOR TOTAL ESTIMADO
	INSUMOS	Valor Unitário	Quantidade	Ação Orçam.	
Realização dos Fóruns de gestão	Diárias DPLAN	R\$ 211,50	10,5	20RL-C	R\$ 2.220,75
	Passagem rodoviária	R\$ 1.163,44	1	20RL-C	R\$ 1.163,44
<b>Valor total</b>				<b>20RL-C</b>	<b>R\$ 3.384,19</b>

AÇÃO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS				VALOR TOTAL ESTIMADO
	INSUMOS	Valor Unitário	Quantidade	Ação Orçam.	
Realização dos Fóruns de gestão	Diárias Dirigentes	R\$ 211,50	84	20RL-C	R\$ 17.766,00
<b>Valor total</b>				<b>20RL-</b>	<b>R\$</b>

valor total	C	17.766,00
-------------	---	-----------

AÇÃO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS				VALOR TOTAL ESTIMADO
	INSUMOS	Valor Unitário	Quantidade	Ação Orçam.	
Realização dos Fóruns de gestão	Cartaz A2, 200 un (lote)	R\$ 330,00	01	20RL-C	R\$ 330,00
	Crachás, 1000 un (lote)	R\$ 680,00	01	20RL-C	R\$ 680,00
	Banner, 09 un, 1,50x080, 11m <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	R\$ 23,22	09	20RL-C	R\$ 209,00
Valor total				20RL-C	R\$ 1.219,00

TOTAL DO PROJETO: R\$ 22.369,19 □

CRONOGRAMA DO PROJETO														
MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO														
AÇÕES	COORD. AÇÃO	ENTREGA	CRONOGRAMA GERENCIAL											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Diagnóstico	Leonardo Araújo	Matriz de Responsabilidade da atualização do PDI								X				
	Leonardo Araújo	Revisão da Análise Pestal e Matriz SWOT do IFRO								X				
	Leonardo Araújo	Realização dos 10 Fóruns de Gestão									X			
	Leonardo Araújo	Entrega do Relatório das contribuições dos Fóruns de										X		

		Gestão													
Revisão do PDI	M <sup>a</sup> Fabiola M. da Assumpção Santos	Revisão do Plano de Oferta de Cursos									X	X	X		
	M <sup>a</sup> Fabiola M. da Assumpção Santos	Revisão do Plano de Obras									X	X	X		
	Leonardo Araújo	Consulta Pública da Revisão do PDI												X	
	Leonardo Araújo	Aprovação da Revisão do PDI junto ao CONSUP													X

### ELABORAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Elaborado por:	Assinatura:	Data:
Leonardo Sousa Araújo	Assinado eletronicamente	19/11/2018

### APROVAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Aprovado por:	Assinatura:	Data:
Presidente do Colégio de Dirigentes	Assinado eletronicamente	



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Sousa Araújo, Diretor(a) de Planejamento**, em 19/11/2018, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos, Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional**, em 19/11/2018, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uberlando Tiburtino Leite, Reitor**, em 23/11/2018, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?)



[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **0404070** e o código CRC **49AB8056**.

---

**Referência:** Processo nº 23243.023441/2018-60

SEI nº 0404070
